
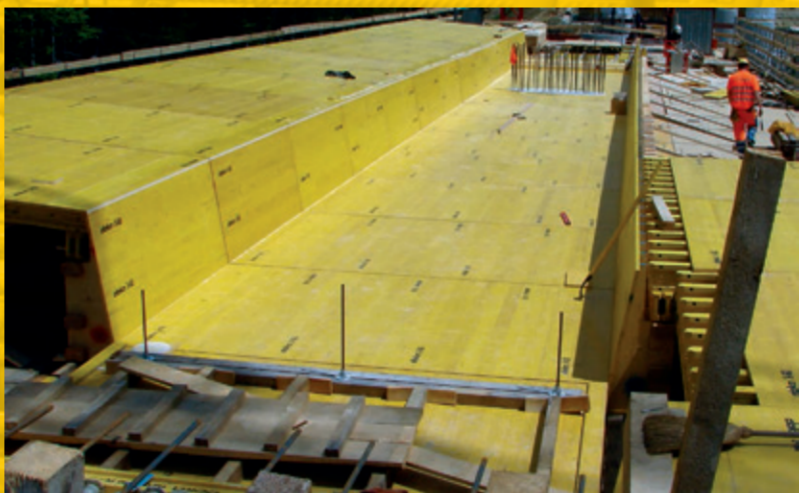


**Ponts Champ Argent
Ponts Fin sous Montoz
L'exécution**

A16

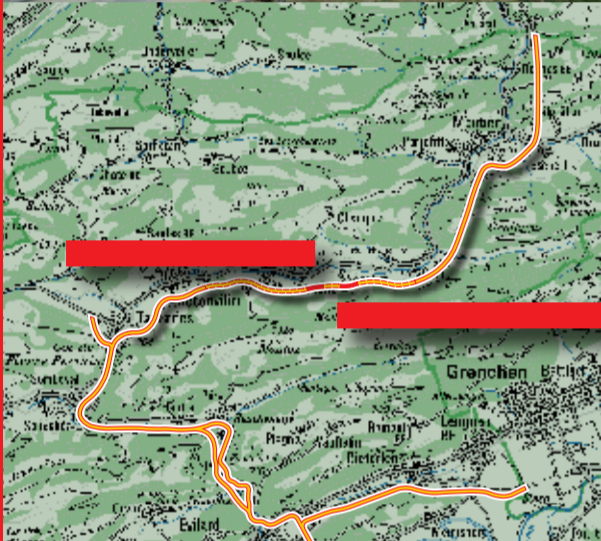

Champ Argent et Fin sous Montoz Programme hebdomadaire pour les tabliers de pont

Activité	Semaine 1		Semaine 2		Semaine 3		Semaine 4		Semaine 5	
	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sa	Dim	Mar	Mer	Jeu	Ven
Tablier étape précédente (i-1)										
Bétonnage										
Décoffrage de la tête										
Mise en tension de la précontrainte transversale										
Mise en tension des câbles de précontrainte longitudinaux 3, 5, 6 sur 2 étapes (i-1) et (i-2) à 100%										
Injection des câbles précontraints										
Abaissement du cintre										
Tablier étape i										
Coiffage										
Ferrailage de l'armature de la poutre de pont										
Ferrailage de l'armature de la dalle de roulement										
Pose des câbles de précontrainte longitudinale (sur bobines)										
Pose des câbles de précontrainte transversale										
Nettoyage du coffrage, préparation pour le bétonnage										
Bétonnage poutre de pont et dalle de roulement										
Décoffrage de la tête										
Mise en tension de la précontrainte transversale										
Mise en tension des câbles de précontrainte longitudinaux 2, 4, 7 sur 2 étapes (i-1) et (i-2) à 100%										
Injection des câbles précontraints										

Schéma d'avancement (état jour X après bétonnage de l'étape i) / étape (i-2) étape (i-1) étape i

Cure du béton
Tabliers bétonnés
Précontrainte longitudinale câbles 3, 5, 6
Précontrainte longitudinale câbles 2, 4, 7
Précontrainte longitudinale câbles 1 + 8
Coffrage
Cintre
2 semaines
gaines videscâbles avec gaine sur bobines
câbles à précontraindre 5 jours après bétonnage sera abaissé 6 jours après bétonnage étape i
